


週間工程表（4週） 工事名 蓼科東急リゾートヴィラ6B・9H・9J棟大規模修繕工事

構造	R C造	契約工期	着工令和3年3月1日	株式会社 日装	作図
現況	地上2階		竣工令和3年7月21日		
面積					

工事場所 長野県 茅野市北山鹿山

工種	実施工程（先週）							実施工程（今週）							予定工程（来週）							予定工程（再来週）							
	4/10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	5/1	2	3	4	5	6	7	
	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	GW明け作業予定
6B	外壁補修							既存シーリング撤去・打設（バルコニー面）																					足場メッシュシート 外壁洗浄（バルコニー面） バルコニー内ウレタン防水 玄関面シーリング
	鉄部・木部塗装							屋根 塗装							化粧木取替														
9H	木部塗装							G-3階段廻り塗装							G-3階段廻り足場払い														足場メッシュシート 外壁洗浄（バルコニー面） 外壁塗装
	アプローチ斫り							アプローチ土間補修							外壁補修							既存シーリング撤去・打設（バルコニー面）							アプローチ土間 アスファルト防水
9J	屋根調査・補修 塗装							鉄部・木部塗装							化粧木取替														足場メッシュシート 外壁補修

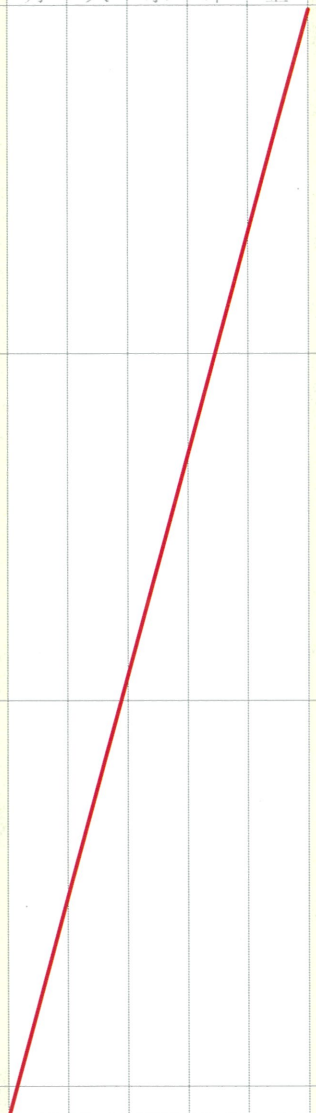

備考
